



ACONDICIONAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y HABILITACION EN INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIO PUBLICO DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN AVE. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA #1276 Y CALLE E EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA



**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010055015

**Datos Generales**

**Contratista** **MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.**

**Numero de Contrato** **OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-001**

**Flujos de Inversión**

**Contratado** **\$1,752,150.90**

**Ejercido** **\$1,752,150.90**

**Avance de Inversión**

**Avance Físico** **100%**

**Avance Financiero** **100%**

**Beneficiados**

**Solicitado por Contraloría del Estado beneficiando a mas de 2,000 usuarios mensuales con instalaciones dignas**

**Observaciones**

**Obra concluida**





**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010054441

**Datos Generales**

Contratista **MONICA CASTILLO VALENZUELA**

Numero de Contrato **OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-003**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$446,678.75**

Ejercido **\$446,678.75**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**


Avance Financiero **100%**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Planeación y Finanzas beneficiando a mas de 1,000 usuarios diarios con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida

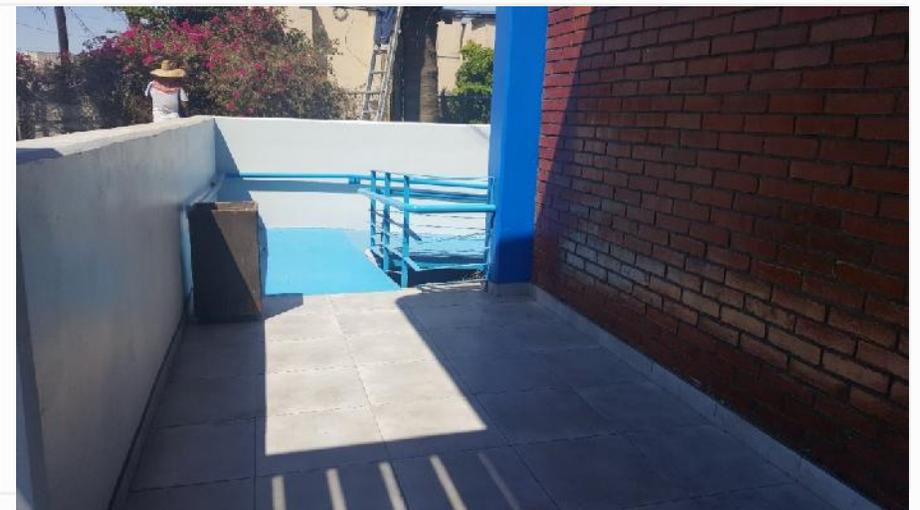



REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBRECAUDACIÓN AUXILIAR DE RENTAS MEXICALI, B.C.  
(PLACAS).



**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010054447

**Datos Generales**

Contratista **MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO**

Numero de Contrato **OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-004**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$238,897.51**

Ejercido **\$238,879.51**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**

Avance Financiero **100%**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Planeación y Finanzas beneficiando a mas de 1,000 usuarios diarios con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida





**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

210010053792

**Datos Generales**

Contratista **GABRIEL RAMOS PARAMO**

Numero de Contrato **OM-D-FAFEF-16-MXL-TEC-EP-005**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$199,752.00**

Ejercido **\$199,752.00**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**

Avance Financiero **100%**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Protección al Ambiente del Estado beneficiando a mas de 1,000 usuarios mensuales con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida





**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010053629

**Datos Generales**

Contratista **MONICA CASTILLO VALENZUELA**

Numero de Contrato **OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-006**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$ 283,298.91**

Ejercido **\$ 283,298.91**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**


Avance Financiero **100%**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Planeación y Finanzas beneficiando a mas de 1,000 usuarios diarios con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida

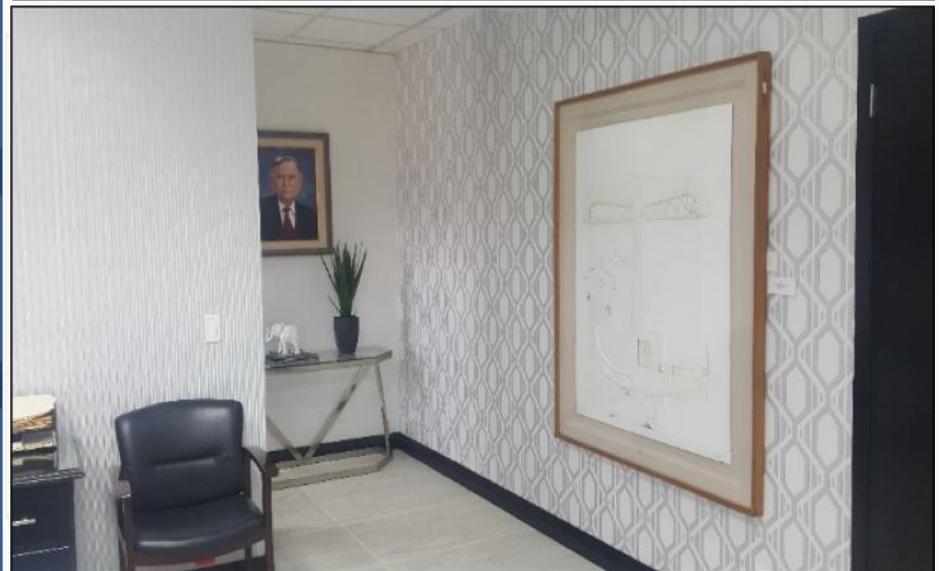



**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010054509

**Datos Generales**

Contratista **MARIO ALBERTO TPIA GALINDO**

Numero de Contrato **OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-007**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$ 261,280.82**

Ejercido **\$261,280.82**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**

Avance Financiero **100%**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Planeación y Finanzas beneficiando a mas de 1,000 usuarios diarios con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra en proceso





OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

10010050957

**Datos Generales**

Contratista **CLAUDIA YAZMIN RIVERA VALDEZ**

Numero de Contrato **OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-009**

**Flujos de Inversión**

Contratado **\$78,443.57**

Ejercido **\$ 78,443.57**

**Avance de Inversión**

Avance Físico **100%**


Avance Financiero **100 %**

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria de Protección al Ambiente del Estado beneficiando a mas de 1,000 usuarios mensuales con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida

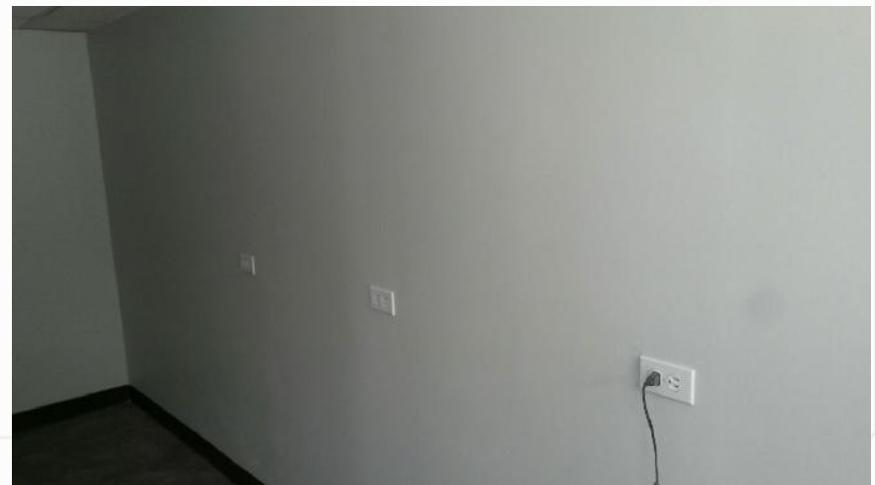



**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010053626

**Datos Generales**

**Contratista** IMPERCAL, S. DE R.L. DE C.V.

**Numero de Contrato** OM-D-FAFEF-16-MXL-TIJ-EP-010

**Flujos de Inversión**

**Contratado** \$108,487.92

**Ejercido** \$ 106,113.31

**Avance de Inversión**

**Avance Físico** 100%

**Avance Financiero** 100%

**Beneficiados**

Solicitado por Secretaria General de Gobierno beneficiando a mas de 1,000 usuarios mensuales con instalaciones dignas

**Observaciones**

Obra concluida





ELABORACION DE BARDA PERIMETRAL PARA PROTECCION DE PREDIO DE GOBIERNO DEL ESTADO UBICADO EN CERRADA DEL SOL EN MEXICALI DE BAJA CALIFORNA



**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010055548

**Datos Generales**

**Contratista** CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS MEXICO AMERICANOS, S.A. DE C.V.

**Numero de Contrato** OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-015

**Flujos de Inversión**

**Contratado** \$ 409,339.77

**Ejercido** \$ 408,339.77

**Avance de Inversión**

**Avance Físico** 100%

**Avance Financiero** 100%

**Beneficiados**

Solicitado por Oficialía Mayor de Gobierno

**Observaciones**

Obra concluida





**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

10010053622

**Datos Generales**

**Contratista** CLAUDIA YAZMIN RIVERA VALDEZ

**Numero de Contrato** OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-016

**Flujos de Inversión**

**Contratado** \$ 99,226.61

**Ejercido** \$99,226.61

**Avance de Inversión**

**Avance Físico** 100%

**Avance Financiero** 100 %

**Beneficiados**

Solicitado por Oficialía Mayor de Gobierno

**Observaciones**

Obra concluida

